
Pople

Hybrid Puzzle: адаптация стандартов управления проектом


Стандарты и принципы проектного управления · неделя 12

Команда: Дияр, Абулхаир, Хамид, Диас

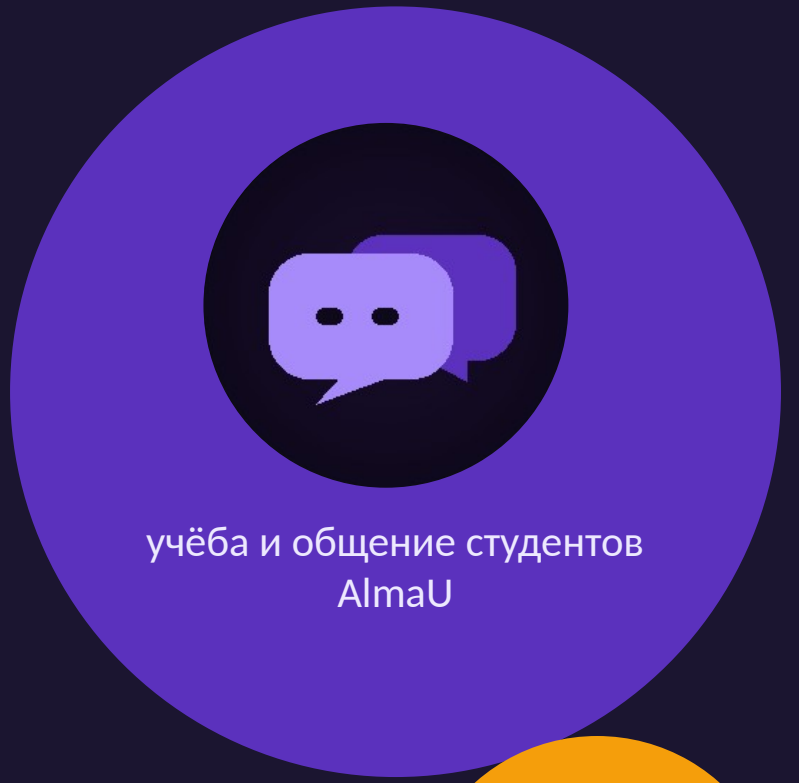


Исходный кейс и базовый план PMBOK

6	8	5 млн ₸	Деп. цифровизации
месяцев на проект	человек в команде	бюджет	заказчик

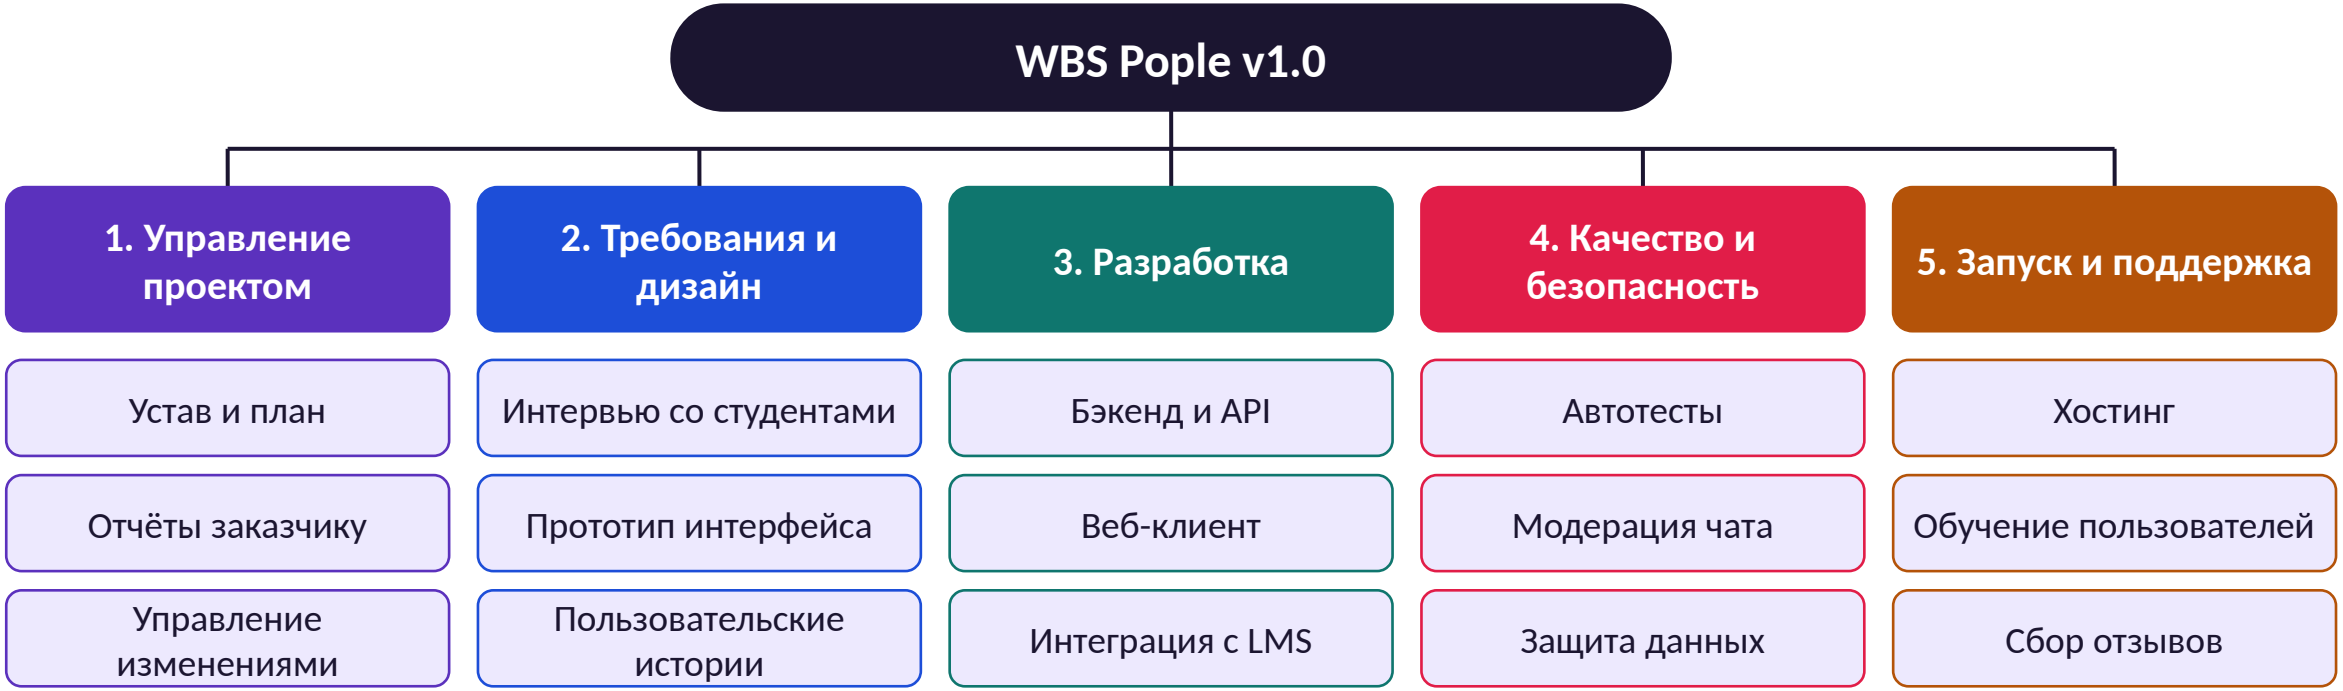

Лента времени: от классики к гибриду

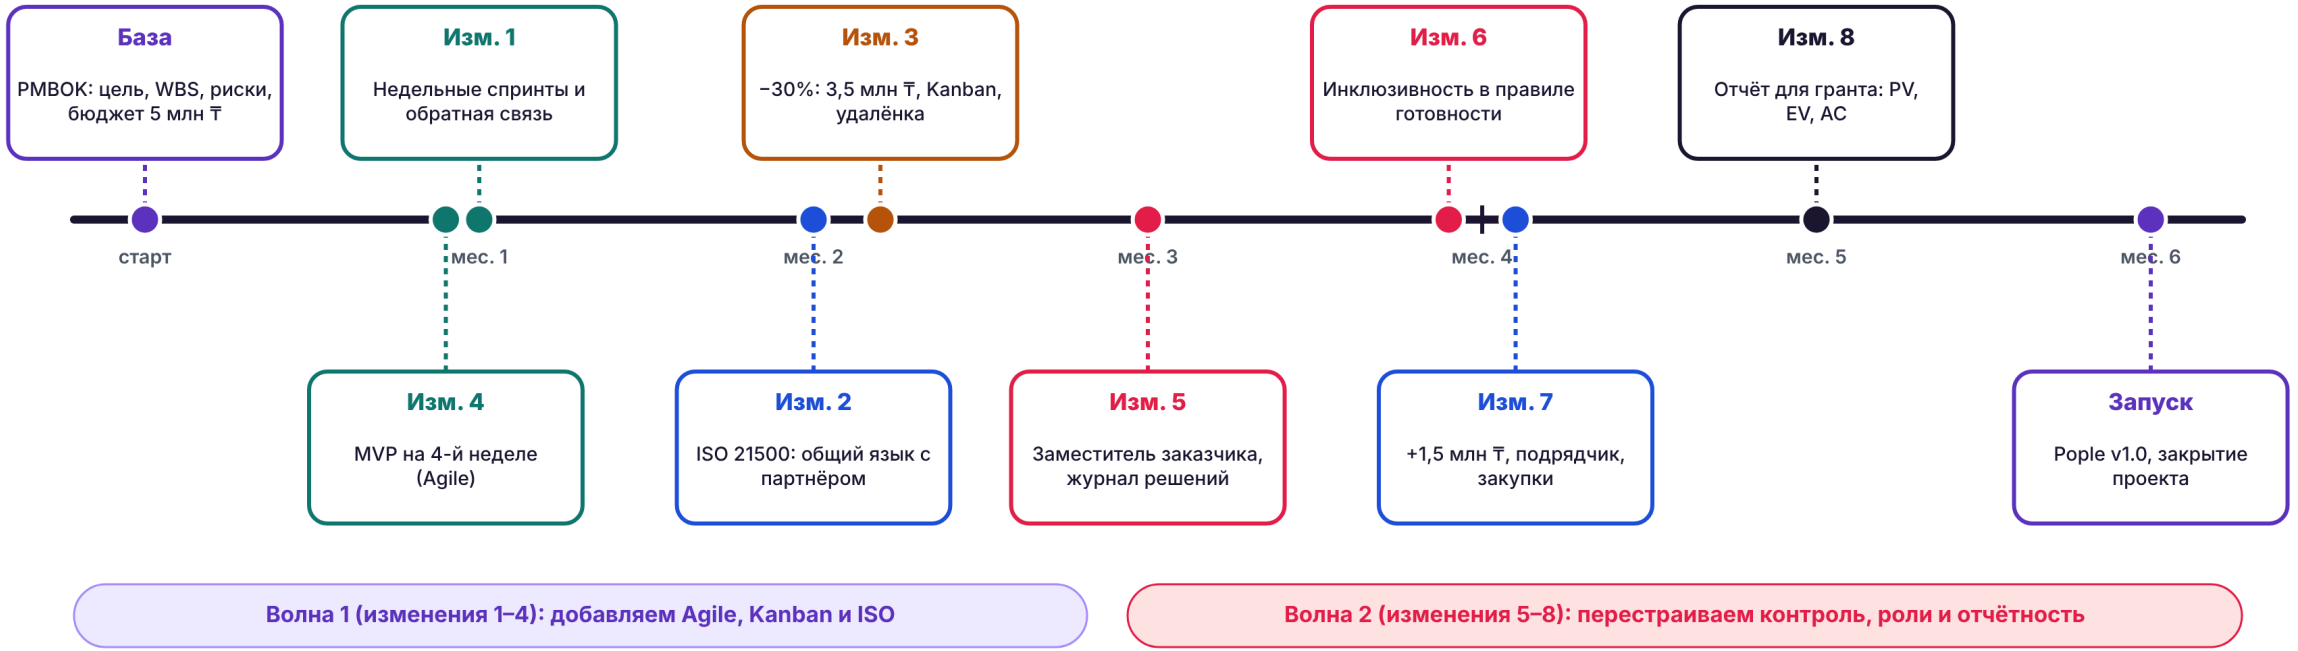

Вехи и бюджет — жёстко (PMBOK), путь к ним — гибко (Agile).

Волна 1: изменения 1–4

1 ИЗМЕНЕНИЕ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Нужны еженедельные обновления и обратная связь

СТАНДАРТ

Scrum + Kanban; вовлечение сторон (PMBOK 7)

РЕЗУЛЬТАТ

Недельный релиз и форма отзыва в приложении

2 ИЗМЕНЕНИЕ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Иностранный партнёр: следуем ISO 21500

СТАНДАРТ

ISO 21500: 5 групп процессов, 10 предметных групп

РЕЗУЛЬТАТ

Таблица PMBOK ↔ ISO, документы на двух языках

3 ИЗМЕНЕНИЕ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Бюджет −30%, часть команды удалённо

СТАНДАРТ

Kanban + MoSCoW; IPMA «Люди»

РЕЗУЛЬТАТ

3,5 млн ₸; LMS и рейтинг — на этап 2

4 ИЗМЕНЕНИЕ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Результат нужен уже через 1 месяц

СТАНДАРТ

Agile: MVP и инкременты; веха PMBOK

РЕЗУЛЬТАТ

Демо на 4-й неделе: вход, расписание, чат

Волна 2: изменения 5–8

5 ИЗМЕНЕНИЕ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Заказчик в отпуске, обратной связи нет

СТАНДАРТ

Заместитель владельца продукта; IPMA «Лидерство»

РЕЗУЛЬТАТ

Журнал решений; простоев больше 2 дней нет

6 ИЗМЕНЕНИЕ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Университет требует инклюзивности

СТАНДАРТ

Качество (PMBOK); IPMA «Культура и ценности»

РЕЗУЛЬТАТ

Доступность в правиле готовности: контраст ≥ 4,5:1

7 ИЗМЕНЕНИЕ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Больше бюджета и внешний подрядчик

СТАНДАРТ

Закупки (PMBOK, ISO 21500); подрядчик в нашем бэклоге

РЕЗУЛЬТАТ

ТЗ и приёмка; 5,0 млн ₸, из них 0,9 — подрядчику

8 ИЗМЕНЕНИЕ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Презентация для грантовой комиссии


СТАНДАРТ

Освоенный объём (PV, EV, AC); IPMA «План и контроль»

РЕЗУЛЬТАТ

Каждый критерий гранта подтверждён фактом

Гибридная модель Pople

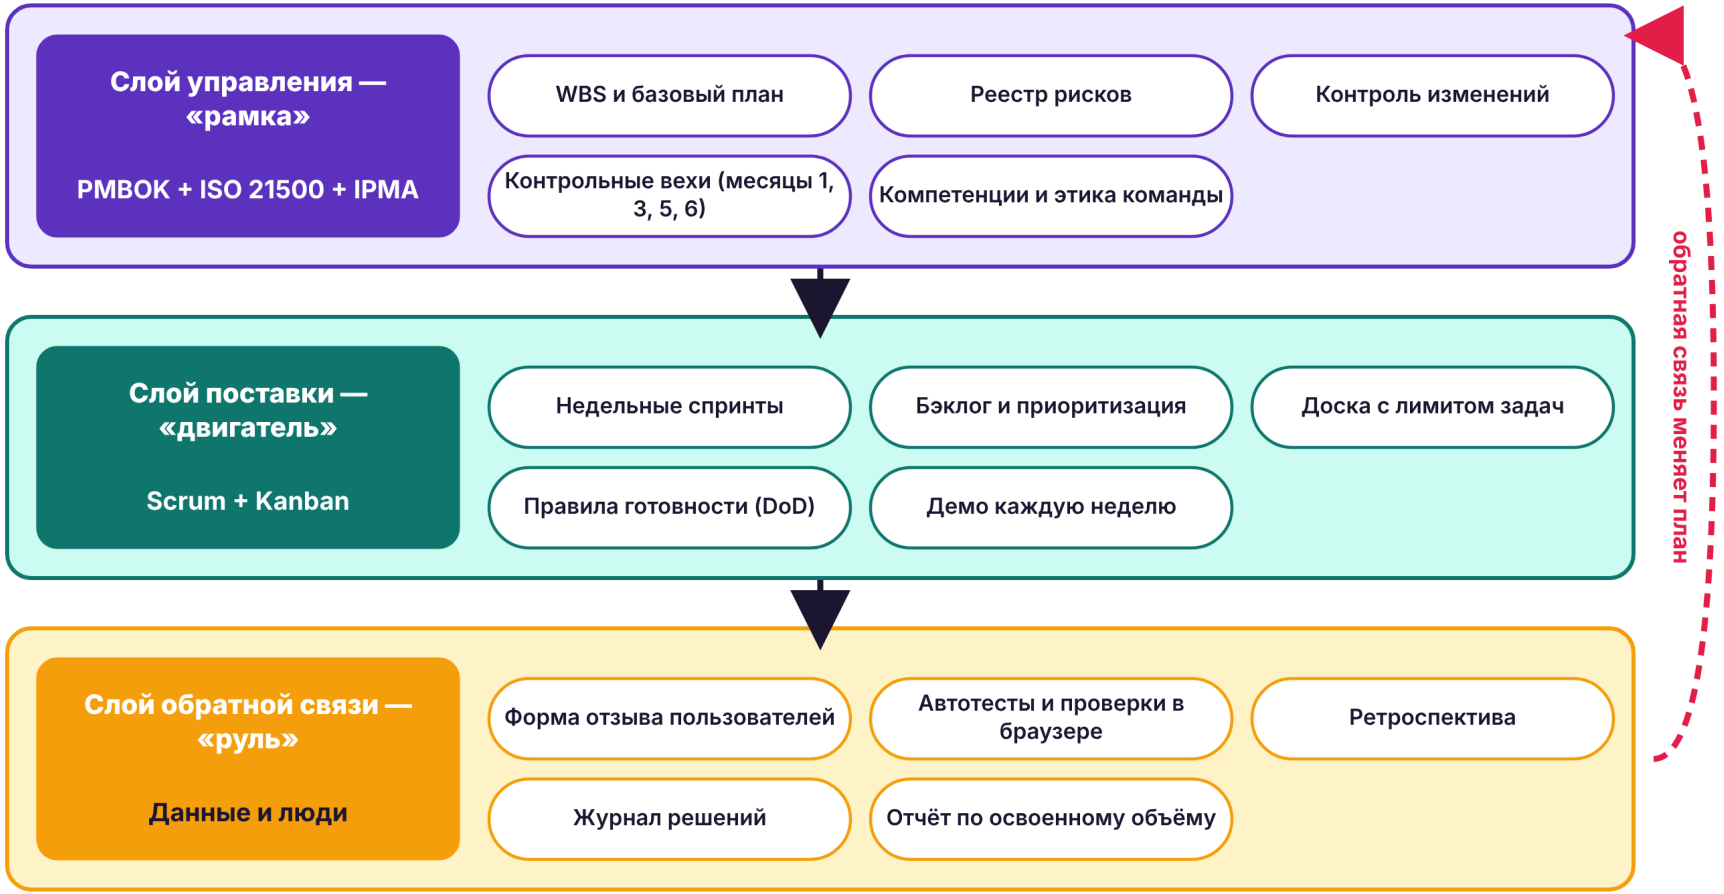


Вехи и бюджет фиксируем жёстко (PMBOK), а способ достижения вех выбираем гибко (Agile). Любое изменение проходит через одну процедуру: запись → оценка влияния → решение → обновление базового плана.

Вехи и бюджет — жёстко, путь к ним — гибко

Любое изменение

1. Запись
2. Оценка влияния
3. Решение
4. Обновление базового плана

Бюджет и карта стандартов

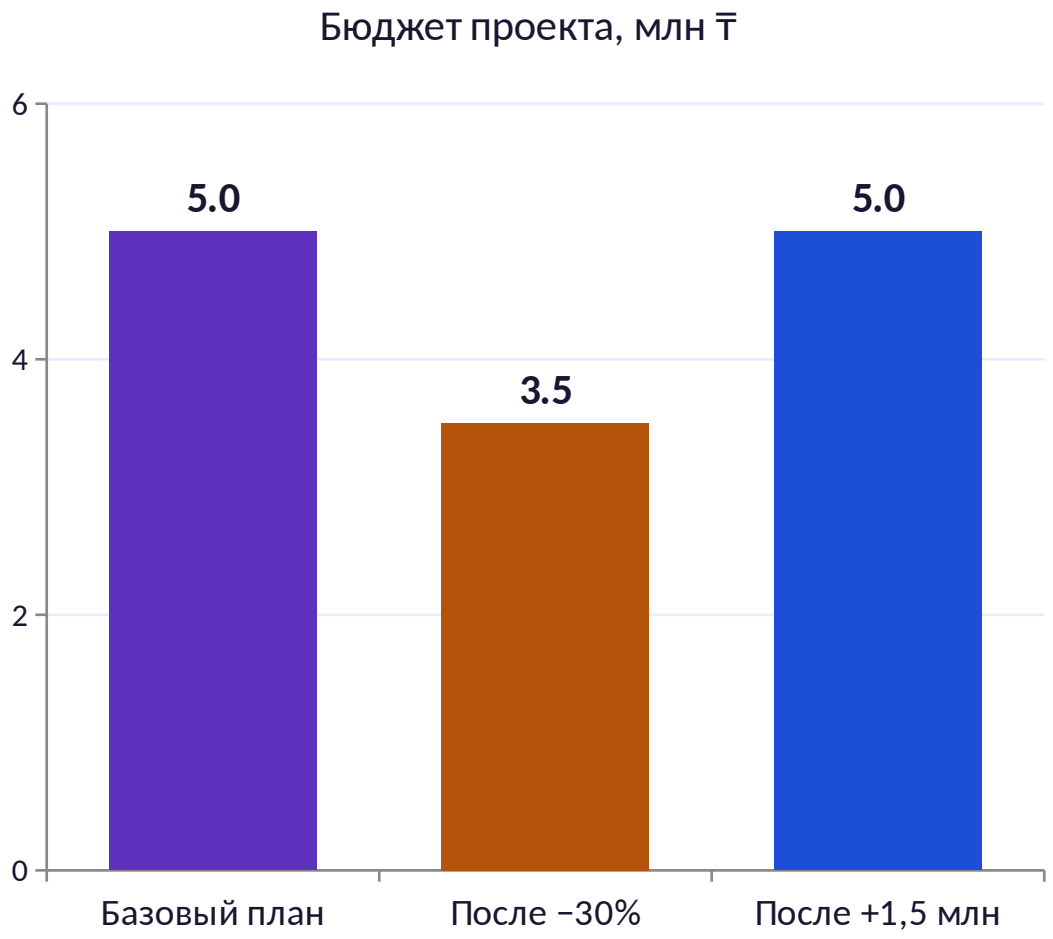

Стандарт	Старт	Волна 1	Волна 2
PMBOK	основа	основа	основа
Agile / Scrum	—	основа	основа
Kanban	—	активно	основа
IPMA (люди)	эпизодически	активно	основа
ISO 21500	—	активно	основа

−30%: LMS и рейтинг активности отложены на этап 2

+1,5 млн: 0,9 млн — подрядчику (LMS и аудит доступности); допущение команды

Чему научились

1

Проверка в бою важнее, чем на бумаге

Тесты были зелёными, а вход в браузере не работал — теперь проверка в реальном браузере входит в правило готовности.

2

Риски сбываются

База стиралась при обновлении сервера, как и предсказывал реестр рисков — теперь у нас постоянный диск.

3

Стандарты комбинируют «зачем»

PMBOK — каркас, Agile — скорость, Kanban — порядок, IPMA — люди, ISO 21500 — общий язык.

Спасибо, готовы к вопросам

Приложение: майнд-карта

