ОТЧЁТ ПО АКТИВНОСТИ

Hybrid Puzzle

Pople — лаборатория адаптации стандартов

Тема недели 12. Гибридные подходы и адаптация стандартов под специфику проекта

Проект	Pople — веб-платформа для студентов AlmaU (учёба и общение в одном кабинете)
Дисциплина	Стандарты и принципы проектного управления
Команда	Дияр, Абулхаир, Хамид, Диас
Тема недели	12. Гибридные подходы и адаптация стандартов под специфику проекта
Состав отчёта	Базовый план по PMBOK; разбор двух выпавших нам карточек (№ 3 и № 5) со стандартами и действиями; схема гибридной модели и майнд-карта; лента времени; текст устной защиты 3–4 минуты; рефлексия

1. Адаптация кейса под проект Pople

Кейс «AlmaLife» из задания перенесён на наш реальный проект Pople — веб-платформу для студентов AlmaU (расписание, оценки, задания, экзамены, анонимный чат, сообщения, клубы и ивенты). Вводные кейса сохранены (6 месяцев, 8 человек, 5 млн ₸, заказчик — департамент цифровизации, интеграция с LMS). Нам выпали две карточки: в первой волне — № 3 «Бюджет сократился на 30%, часть команды работает удалённо», во второй — № 5 «Ключевой заказчик уходит в отпуск, нет обратной связи». Обе мы проверяем на настоящем опыте: Pople работает на бесплатных тарифах, команда трудится удалённо через GitHub, а клубы-заказчики не всегда отвечали вовремя.

Исходные вводные

Параметр	Значение
Срок	6 месяцев
Команда	8 человек: 4 участника (Дияр, Абулхаир, Хамид, Диас) + разработчик, дизайнер, тестировщик, преподаватель-эксперт
Бюджет	5 млн ₸
Заказчик	Департамент цифровизации университета
Требования	Понятный интерфейс; интеграция с LMS (Moodle / Platonus)

Что делали: (1) собрали базовый план по классическому стандарту PMBOK; (2) отреагировали на выпавшие нам изменения — карточку № 3 в первой волне и карточку № 5 во второй, — комбинируя Kanban, Agile-практики, IPMA и PMBOK; (3) подготовили гибридную модель и презентацию.

2. Этап 1. Базовый план по PMBOK

2.1 Цель проекта

За 6 месяцев выпустить Pople v1.0 — единый кабинет студента AlmaU (расписание, оценки, задания, чат, ивенты) с интеграцией с LMS, в рамках 5 млн ₸ и силами 8 человек.

Критерии успеха: v1.0 запущена в срок; бюджет не превышен; интеграция с LMS работает; понятный интерфейс подтверждён отзывами студентов.

2.2 Состав работ (WBS)

Иерархическая структура работ делит проект на пять пакетов; каждый пакет — три рабочих результата. Нумерация нужна, чтобы привязать к ней бюджет, риски и ответственных.



Рисунок 1 — WBS проекта Pople: пять пакетов работ

2.3 План коммуникаций

Кто	Как и как часто	Ответственный
Заказчик (департамент цифровизации)	Ежемесячный отчёт, контрольные точки	Руководитель проекта
Команда	Ежедневные 15 минут, общий чат, трекер задач	Тимлид
Студенты (пользователи)	Форма отзыва на сайте, опросы	Хамид
Преподаватели	Встречи по приёмке функций	Руководитель проекта

2.4 Плановая смета

Базовый план стоимости — 5 млн ₸ с резервом 10% на непредвиденное.

Статья	Сумма, тыс. ₸	Доля
Управление проектом	500	10%
Требования и дизайн	750	15%
Разработка	2 000	40%
Качество и безопасность	750	15%
Запуск и поддержка	500	10%
Резерв	500	10%
Итого	**5 000**	**100%**

2.5 Календарный план и контрольные вехи

Период	Результат
Месяц 1	Устав, требования, прототип
Месяц 2	Основа системы: аккаунты, роли, расписание
Месяцы 3–4	Разработка: задания, оценки, чат
Месяц 5	Тестирование, безопасность, пилот
Месяц 6	Запуск, передача заказчику, закрытие

2.6 Реестр рисков

Риски R1–R5 заложены в базовый план, R6–R7 появились после карточек. Часть из них — не теория: потеря данных при обновлении сервера у нас уже случалась.

№	Риск	Вероятность	Влияние	Ответ на риск	Владелец
R1	Потеря данных при обновлении сервера (у нас это реально случалось)	Высокая	Высокое	Постоянный диск, резервные копии, миграции схемы	Дияр
R2	Злоупотребления в анонимном чате	Средняя	Высокое	Жалобы, блокировка, автобан, лимиты запросов	Абулхаир
R3	Требования заказчика меняются	Высокая	Среднее	Бэклог, приоритизация, процедура изменений	Хамид
R4	Утечка персональных данных	Низкая	Высокое	Хеширование паролей и токенов, политика данных	Абулхаир
R5	Срыв интеграции с LMS	Средняя	Высокое	Ранний прототип, договорённость о API с владельцем LMS	Дияр
R6	Заказчик недоступен, решения встают	Высокая	Среднее	Заместитель с правом решения, журнал решений, разумные умолчания	Хамид
R7	Удалённая команда теряет синхронность	Средняя	Среднее	Доска Kanban с лимитом задач, письменный стендап, общий чат	Дияр

3. Этап 2. Волна 1 — карточка № 3

Нам выпали две карточки: в первой волне — № 3, во второй — № 5. Для каждой мы выяснили, какие элементы других стандартов нужно добавить, как меняется план и по каким показателям поймём, что адаптация сработала. Столбец «Что уже есть у Pople» показывает, что решения опираются на реальный проект, а не на выдуманный пример.

Бюджет −30%, часть команды работает удалённо

Суть адаптации: сокращение бюджета мы превращаем в расстановку приоритетов, а не в «минус 30% везде», а нехватку людей и денег компенсируем порядком в потоке работ (Kanban) и автоматизацией проверок.

Что изменилось	Бюджет сократился на 30%, часть команды работает удалённо
Главный риск	Перегрузка удалённой команды и потеря синхронности
Стандарты и элементы	Kanban (лимит задач в работе) + MoSCoW; IPMA: компетенции «Люди»; PMBOK: контроль изменений
Что делаем (по шагам)	1. Записали изменение и оценили влияние: бюджет 5 → 3,5 млн ₸ (−1,5 млн), часть команды вне офиса 2. Провели через процедуру контроля изменений PMBOK и утвердили новый базовый план стоимости 3. Расставили приоритеты по MoSCoW: безопасность, расписание, оценки, задания — обязательно; интеграция с LMS и рейтинг активности — на этап 2 4. Перешли на Kanban: общая доска, лимит задач в работе, письменный стендап вместо созвонов 5. Закрыли нехватку тестировщика автоматическими тестами и бесплатными тарифами хостинга 6. Из IPMA взяли компетенции «Люди»: доверие, ясные договорённости, коммуникация на расстоянии
Как поймём, что получилось	Расходы ≤ 3,5 млн ₸; число задач в работе ≤ лимита
Что уже есть у Pople	Сервис уже работает на бесплатных тарифах (Vercel, Railway, Brevo), команда работает через GitHub.

Как перераспределили бюджет

Новый базовый план стоимости утверждён через процедуру контроля изменений PMBOK. Больше всего уменьшили разработку: интеграция с LMS и рейтинг активности перенесены на этап 2. Качество и безопасность почти не тронули — это обязательная часть по MoSCoW.

Статья	Было, тыс. ₸	Стало, тыс. ₸	Изменение	Почему
Управление проектом	500	400	−100	меньше встреч, письменные отчёты
Требования и дизайн	750	550	−200	готовые компоненты интерфейса
Разработка	2 000	1 350	−650	интеграция с LMS и рейтинг — на этап 2
Качество и безопасность	750	700	−50	почти не режем: безопасность обязательна
Запуск и поддержка	500	300	−200	бесплатные тарифы хостинга и почты
Резерв	500	200	−300	резерв уменьшен, риски под контролем
Итого	**5 000**	**3 500**	**−1 500**	**−30%**



Рисунок 2 — Бюджет проекта: базовый план и после карточки № 3, тыс. ₸

4. Этап 3. Волна 2 — карточка № 5

Ключевой заказчик в отпуске, нет обратной связи

Суть адаптации: обратной связи нет, поэтому мы заменяем её формальным механизмом: заместитель с правом решения, журнал решений и заранее согласованные умолчания. Бюджет в этой волне не меняется и остаётся 3,5 млн ₸.

Что изменилось	Ключевой заказчик уходит в отпуск — нет обратной связи
Главный риск	Простой задач и расхождение с ожиданиями заказчика
Стандарты и элементы	Agile: заместитель владельца продукта; PMBOK: управление заинтересованными сторонами; IPMA: «Лидерство»
Что делаем (по шагам)	1. Записали изменение: заказчик недоступен, ответов на вопросы нет 2. Назначили заместителя заказчика с правом принимать решения в заранее оговорённых пределах 3. Завели журнал решений: что решили, почему, кто и когда — заказчик видит всё после отпуска 4. Согласовали «разумные умолчания» и порог эскалации: что решаем сами, что ждёт возвращения 5. Сократили петлю обратной связи: короткое демо раз в неделю для заместителя 6. Из PMBOK — управление заинтересованными сторонами, из IPMA — лидерство и ответственность команды
Как поймём, что получилось	Ни одной задачи не простаивает из-за ожидания ответа > 2 дней
Что уже есть у Pople	Мы уже работали без ответа клубов, фиксируя допущения в README.

Как изменились контроль, коммуникации и роли

Что	Было (после карточки 3)	Стало (после карточки 5)
Контроль	Контроль изменений и недельный взгляд на доску задач	Плюс журнал решений и порог эскалации: кому и когда передаём вопрос
Коммуникации	Ежемесячный отчёт заказчику, письменный стендап в команде	Недельное короткое демо для заместителя; заказчик после отпуска читает журнал
Роли	Заказчик принимает решения	Заместитель заказчика принимает решения в оговорённых пределах; команда сама решает по «разумным умолчаниям»

5. Гибридная модель управления

5.1 Мини-схема: три слоя

Вехи и бюджет фиксируем жёстко (PMBOK), путь к ним выбираем гибко: Kanban держит поток при нехватке людей и денег, а заместитель заказчика и журнал решений не дают задачам стоять, когда обратной связи нет. Любое изменение проходит одну процедуру: запись → оценка влияния → решение → обновление базового плана.



Рисунок 3 — Гибридная модель Pople: рамка, двигатель, руль

5.2 Майнд-карта

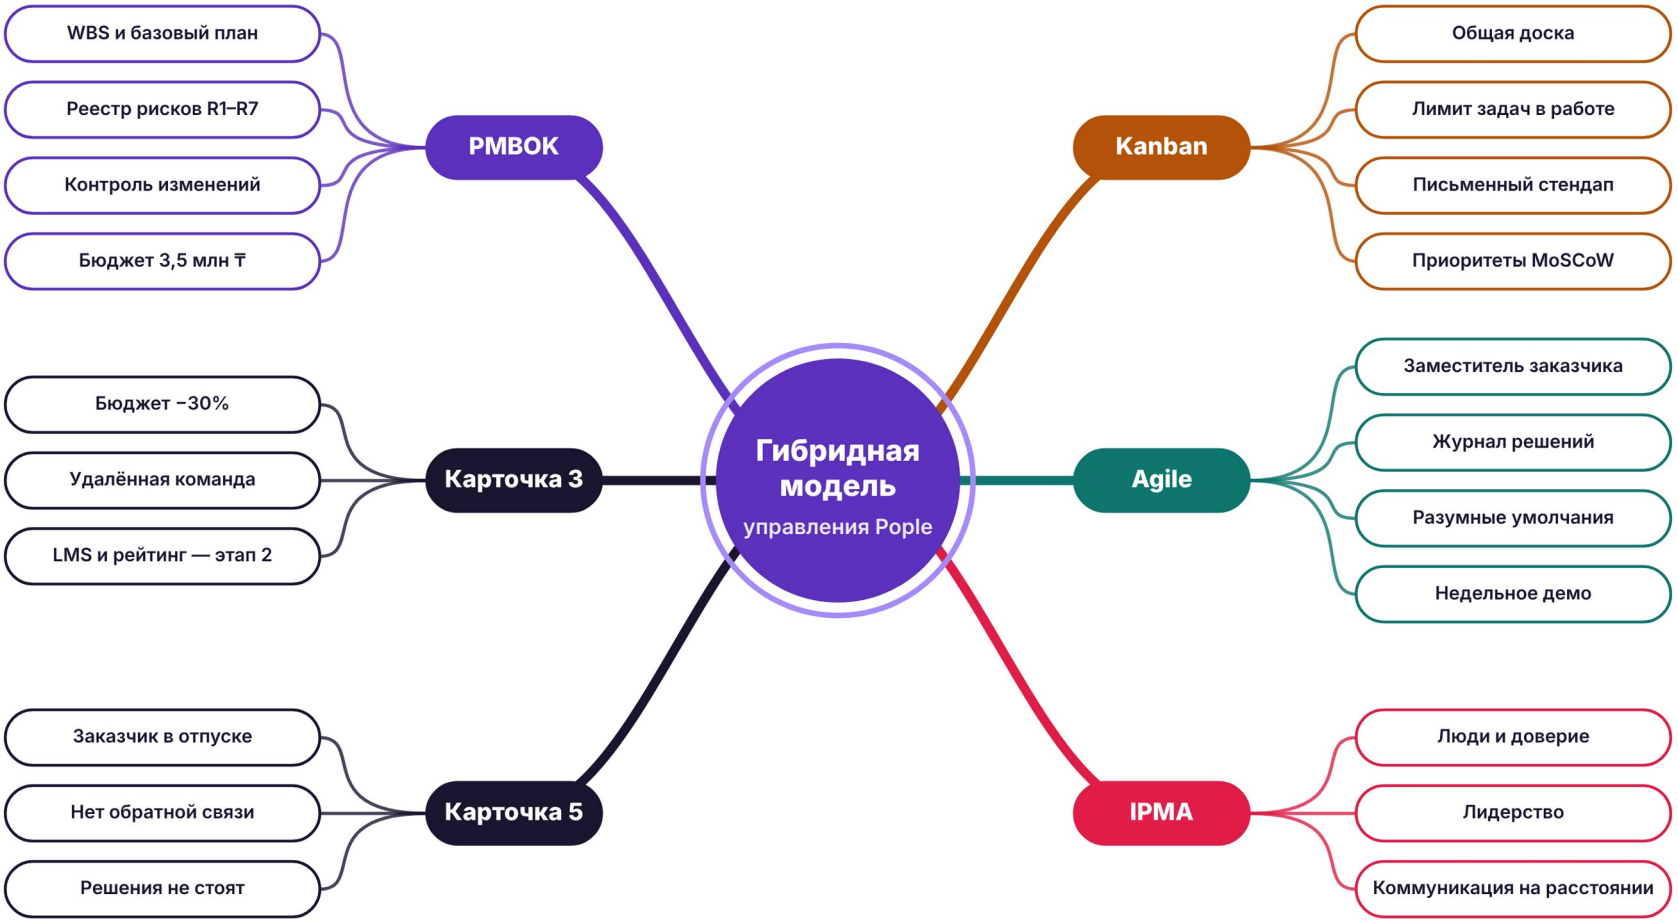


Рисунок 4 — Майнд-карта гибридной модели: стандарты, их элементы и две карточки

5.3 Какие стандарты работали на каждом этапе

Матрица показывает, как менялась роль каждого подхода: PMBOK остаётся основой на всех этапах, Kanban и IPMA подключаются в первой волне, Agile-практики — во второй. Оценка экспертная, по итогам анализа карточек.

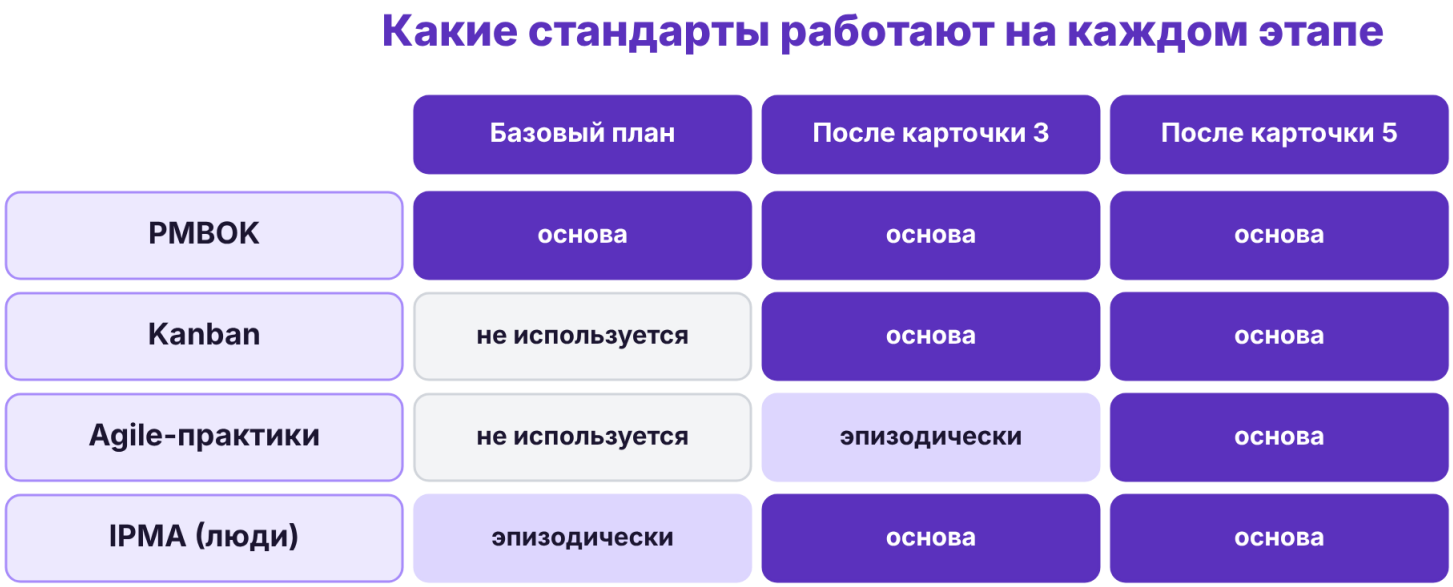


Рисунок 5 — Использование стандартов: базовый план и две волны изменений

5.4 Лента времени

От «чистого» PMBOK в начале проекта до гибрида к запуску: оба изменения отмечены на ленте и привязаны к стандартам, которые мы подключили.



Рисунок 6 — Лента времени проекта: две карточки и два изменения плана

6. Устная защита (3–4 минуты)

Формат: выступает один человек, выбранный преподавателем; текст ниже — для любого из команды. Объём ≈ 431 слов, это около 3,1 мин при спокойном темпе. Показывать можно схему гибридной модели и ленту времени.

Время	Блок	Что говорим
0:00–0:35	Что за проект и с чего начали	Здравствуйте! Мы — команда Pople: Дияр, Абулхаир, Хамид и Диас. Pople — это платформа для студентов AlmaU: в одном кабинете расписание, оценки, задания, экзамены и общение. По условиям кейса у нас шесть месяцев, восемь человек и пять миллионов тенге. Мы начали по классике, по PMBOK: цель, структура работ WBS из пяти пакетов, бюджет, реестр рисков и план коммуникаций. Нам выпали две карточки: в первой волне — бюджет минус тридцать процентов и удалённая команда, во второй — заказчик ушёл в отпуск. Часть Pople уже работает, поэтому проверяем мы всё на настоящем продукте.
0:35–1:35	Первая волна: бюджет −30% и удалёнка	Первая карточка: бюджет сократился на тридцать процентов, до трёх с половиной миллионов, и часть команды работает удалённо. Мы не стали резать везде поровну. Сначала провели изменение через контроль изменений PMBOK и утвердили новый базовый план. Потом расставили приоритеты по MoSCoW: безопасность, расписание, оценки и задания обязательны, а интеграцию с LMS и рейтинг активности отложили на второй этап. Для удалённой работы взяли Kanban: общая доска, лимит задач в работе и письменный стендап вместо созвонов. Из IPMA взяли компетенции «Люди» — доверие и ясные договорённости на расстоянии. А отсутствие тестировщика закрыли автоматическими тестами: у нас их сто сорок семь, плюс девяносто две проверки в настоящем браузере.
1:35–2:30	Вторая волна: заказчик в отпуске	Вторая карточка: ключевой заказчик ушёл в отпуск, и обратной связи нет. Опасность в том, что задачи встанут в ожидании ответа. Поэтому мы сделали три вещи. Назначили заместителя заказчика с правом принимать решения в оговорённых пределах. Завели журнал решений: что решили, почему и кто — чтобы заказчик после отпуска видел всё. И заранее согласовали разумные умолчания и порог эскалации: что решаем сами, а что ждёт возвращения. Раз в неделю даём заместителю короткое демо. Из PMBOK здесь работает управление заинтересованными сторонами, из IPMA — лидерство. Мы уже так жили: клубы отвечали не всегда, и допущения мы фиксировали в README.
2:30–3:00	Как устроена гибридная модель	Итог — три слоя. Сверху рамка: PMBOK и IPMA — вехи, бюджет, реестр рисков и контроль изменений. В середине двигатель: Kanban с приоритетами MoSCoW. Внизу руль: заместитель заказчика, журнал решений, автотесты и ретроспектива. Правило простое: вехи и бюджет жёсткие, путь к ним гибкий. Любое изменение проходит одну процедуру: запись, оценка влияния, решение, обновление базового плана.
3:00–3:40	Чему научились	Чему мы научились. Первое: сокращение бюджета — это приоритеты, а не минус тридцать процентов везде. Второе: при удалёнке и нехватке денег автоматизация заменяет людей, и именно проверка в настоящем браузере нашла ошибку, которую пропустили тесты на подменённых данных. Третье: без заказчика задачи не стоят, если есть заместитель и журнал решений. И экономия создаёт риски: на бесплатных тарифах база данных стиралась при обновлении, и теперь у нас постоянный диск. Главный вывод: гибрид — это осознанный выбор подхода под каждую часть проекта. Спасибо, готовы к вопросам.

7. Рефлексия: чему научились

Какие стандарты чаще комбинировались. В нашем разборе: PMBOK — в 2 из 2 карточек; IPMA — в 2 из 2 карточек; Agile — в 1 из 2 карточек; Kanban — в 1 из 2 карточек; MoSCoW — в 1 из 2 карточек. PMBOK оказался каркасом в обеих карточках, Kanban отвечал за порядок при нехватке ресурсов, Agile-практики — за связь с заказчиком, IPMA — за людей.

Какие принципы оказались универсальными. Прозрачность (доска, журнал решений, отчёт), единая процедура изменений, вовлечение заинтересованных сторон и проверка результата «в бою».

Как справлялись с изменениями. Не переписывали план, а менялись по процедуре: запись → оценка влияния → решение → обновление базового плана. Выводы:

1. **Сокращение бюджета — это приоритеты, а не «минус 30% везде».** Мы провели его через процедуру изменений: безопасность почти не тронули, интеграцию с LMS и рейтинг отложили на этап 2. План остаётся базой для сравнения, но не законом.
2. **При удалёнке и нехватке денег автоматизация заменяет людей.** Вместо отдельного тестировщика у нас 147 автотестов бэкенда и 92 проверки в настоящем браузере. Именно проверка в браузере нашла ошибку, которую тесты на подменённых данных пропустили.
3. **Без заказчика задачи не должны стоять.** Заместитель с правом решения, журнал решений и разумные умолчания работают. Мы так жили, когда клубы не отвечали: допущения фиксировали в README.
4. **Экономия создаёт риски — их надо закрывать.** На бесплатных тарифах база данных стиралась при обновлении сервера. Ответ: постоянный диск и миграции схемы.
5. **Стандарты комбинируют «зачем», а не «все сразу».** PMBOK дал каркас и контроль изменений, Kanban — порядок при нехватке ресурсов, IPMA — людей, Agile-практики — связь с заказчиком.

8. Чек-лист соответствия заданию

Проверка отчёта по требованиям активности и по критериям высокой оценки.

	Требование
☑️	Базовый план по PMBOK: цель, WBS, бюджет, риски, коммуникации
☑️	Таблица изменений: карточки № 3 и № 5 со стандартами и действиями
☑️	Мини-схема гибридного подхода (три слоя) и карта стандартов
☑️	Лента времени: база → карточка 3 → карточка 5
☑️	Бюджет 5 → 3,5 млн ₸ по статьям с обоснованием
☑️	Устная защита 3–4 минуты по готовому тексту
☑️	Рефлексия: какие стандарты комбинировали и что универсально
☑️	Каждый шаг привязан к нашему реальному проекту Pople
