
Pople

Hybrid Puzzle: адаптация стандартов управления проектом


Стандарты и принципы проектного управления · неделя 12

Команда: Дияр, Абулхаир, Хамид, Диас

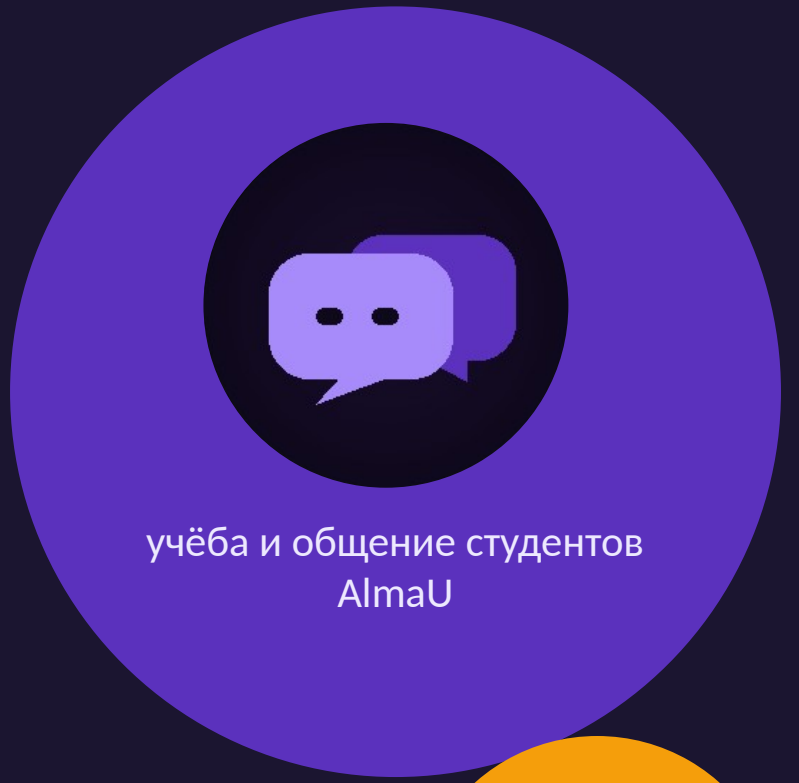

Исходный кейс и базовый план PMBOK

6	8	5 млн ₸	Деп. цифровизации
месяцев на проект	человек в команде	бюджет	заказчик

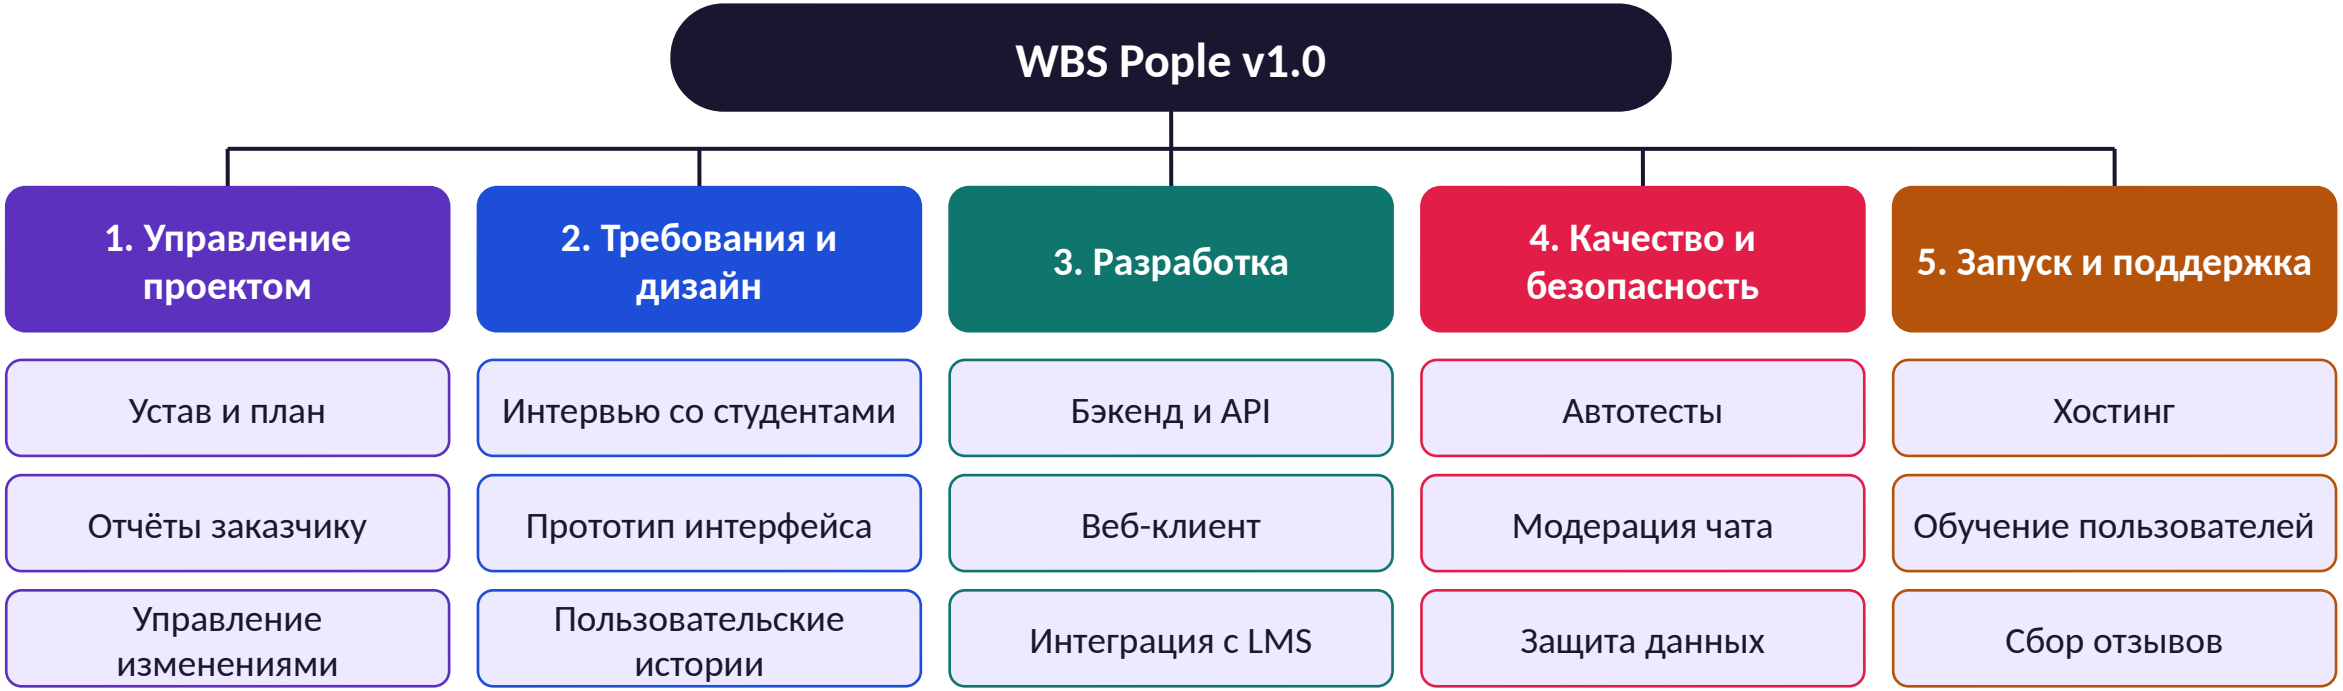

Лента времени: от классики к гибриду



Волна 1 — карточка 3: добавляем Kanban, MoSCoW и компетенции «Люди»

Волна 2 — карточка 5: заместитель заказчика, журнал решений

Карточка 3 → месяц 2

Бюджет 3,5 млн ₸, Kanban, MoSCoW, письменный стендап

Карточка 5 → месяц 3–4

Заместитель заказчика, журнал решений, умолчания

Карточка 3: бюджет −30% и удалённая команда

1

Приоритеты MoSCoW

Безопасность, расписание, оценки, задания — обязательно; LMS и рейтинг активности — на этап 2

2

Kanban вместо созвонов

Общая доска, лимит задач в работе, письменный стендап для удалённой команды

3

IPMA: компетенции «Люди»

Доверие, ясные договорённости и коммуникация на расстоянии

4

Автотесты вместо тестировщика

147 тестов бэкенда и 92 проверки в реальном браузере

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Бюджет сократился на 30%, часть команды работает удалённо

КАК ПОЙМЁМ, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Расходы ≤ 3,5 млн ₸; число задач в работе ≤ лимита

У НАС УЖЕ ТАК

Сервис уже работает на бесплатных тарифах (Vercel, Railway, Brevo), команда работает через GitHub.

Карточка 5: заказчик в отпуске, нет обратной связи

1. **Заместитель заказчика**
   Человек с правом решения в заранее оговорённых пределах

2. **Журнал решений**
   Что решили, почему, кто и когда — заказчик видит всё после отпуска

3. **Умолчания и эскалация**
   Заранее согласовано, что решаем сами, а что ждёт возвращения

4. **Недельное демо**
   Короткий показ заместителю — петля обратной связи не рвётся

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Ключевой заказчик уходит в отпуск — нет обратной связи


КАК ПОЙМЁМ, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Ни одной задачи не простаивает из-за ожидания ответа > 2 дней

У НАС УЖЕ ТАК

Мы уже работали без ответа клубов, фиксируя допущения в README.

Гибридная модель Pople

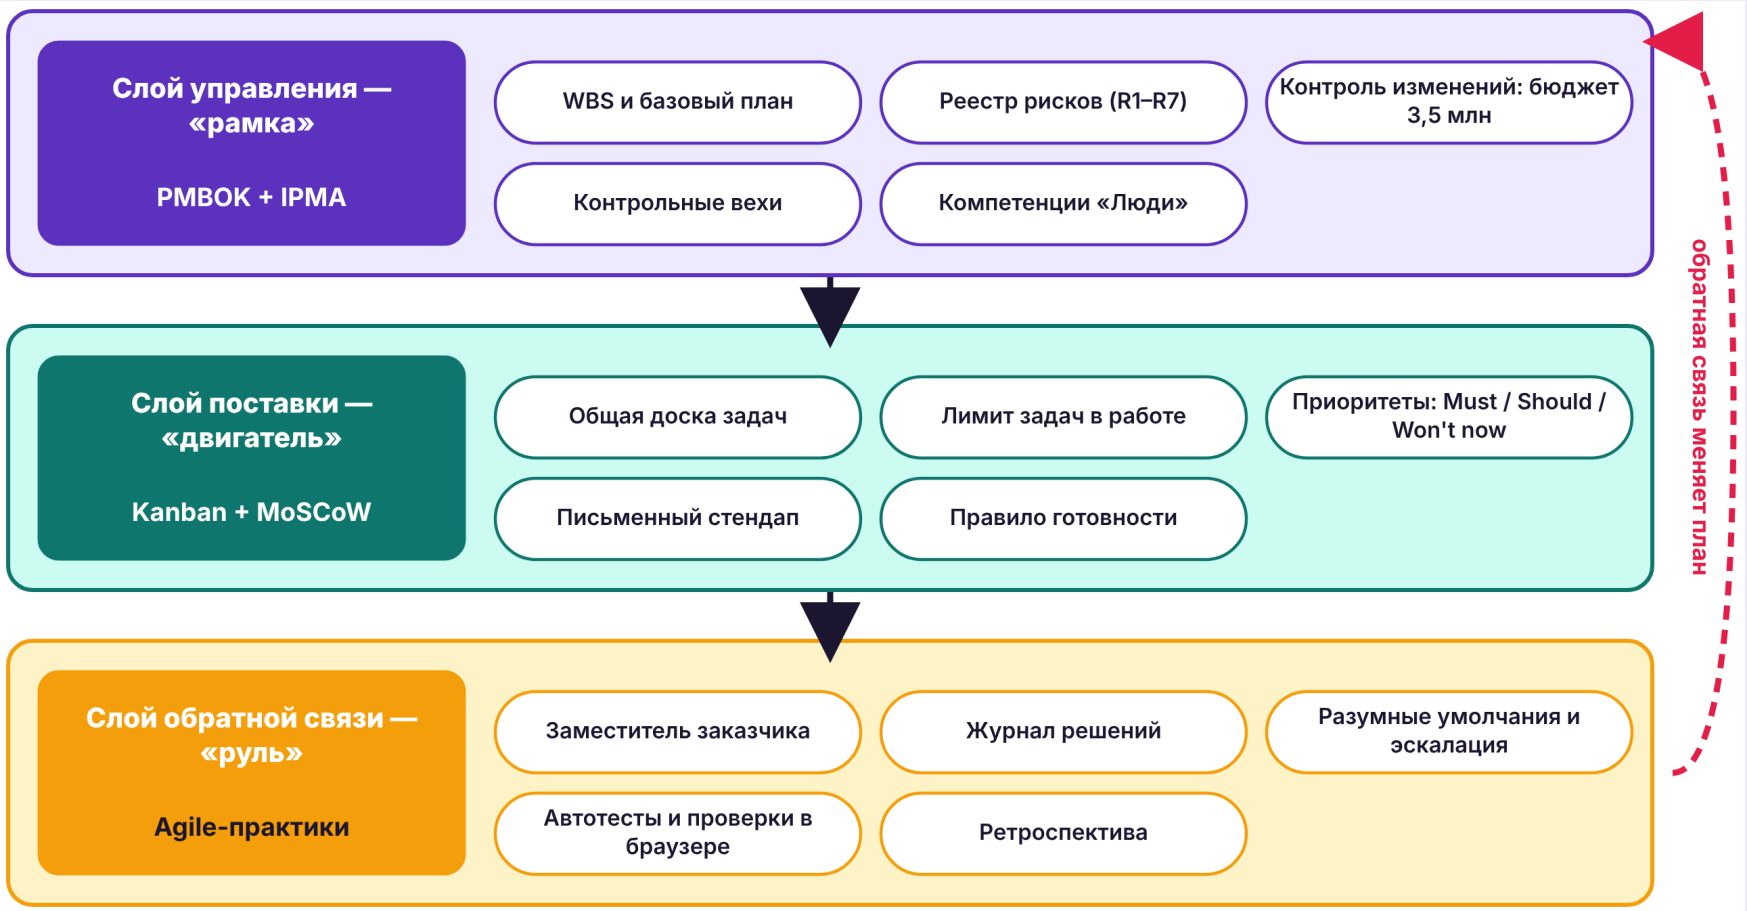


Вехи и бюджет фиксируем жёстко (PMBOK), путь к ним выбираем гибко: Kanban держит поток при нехватке людей и денег, а заместитель заказчика и журнал решений не дают задачам стоять, когда обратной связи нет. Любое изменение проходит одну процедуру: запись → оценка влияния → решение → обновление базового плана.

Вехи и бюджет — жёстко, путь к ним — гибко

Любое изменение

1. Запись
2. Оценка влияния
3. Решение
4. Обновление базового плана

Бюджет 5 → 3,5 млн ₸ и карта стандартов

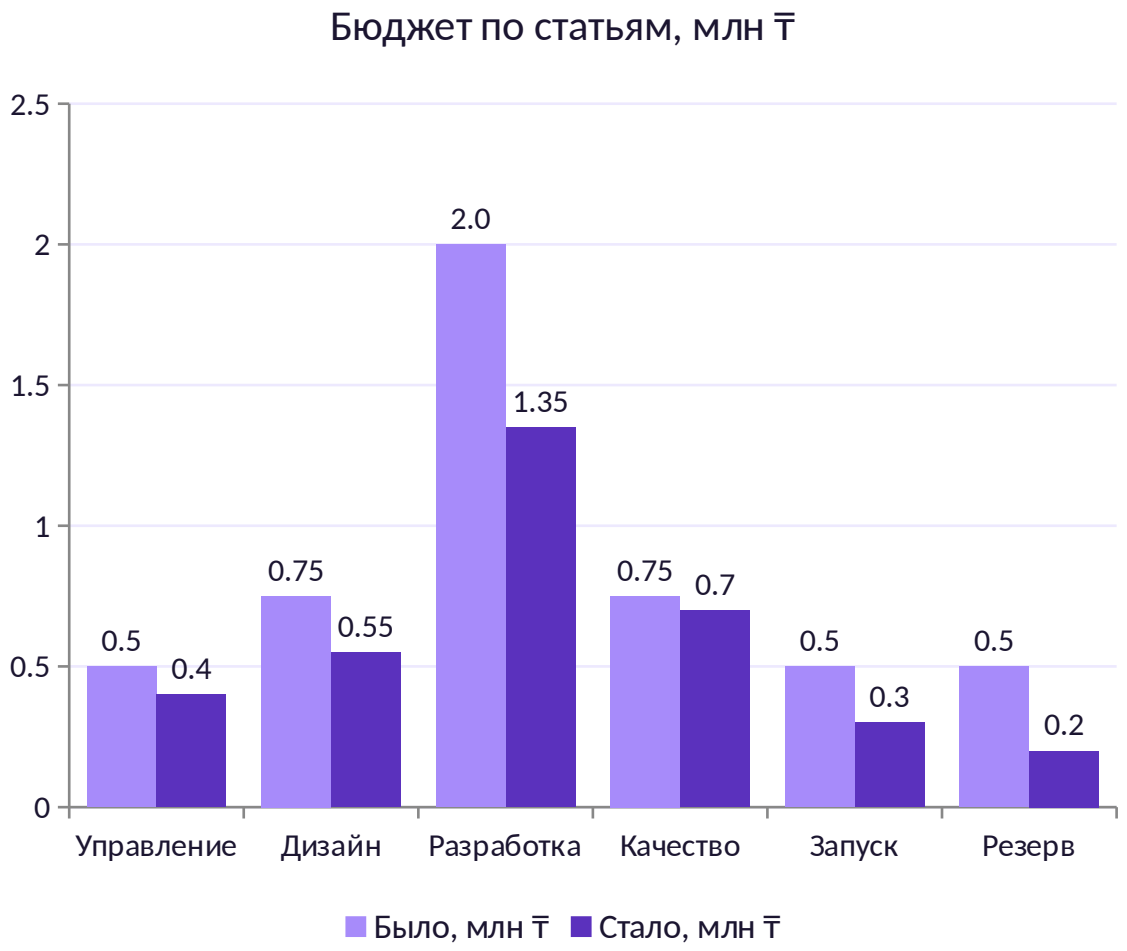

Стандарт	Старт	Карточка 3	Карточка 5
PMBOK	**основа**	**основа**	**основа**
Kanban	—	**основа**	**основа**
Agile-практики	—	эпизодически	**основа**
IPMA (люди)	эпизодически	**основа**	**основа**

−1,5 млн ₸: основная экономия — разработка (−0,65): LMS и рейтинг ушли на этап 2

Не режем: качество и безопасность (−0,05) — они обязательны

Чему научились

1

Бюджет −30% — это приоритеты

Безопасность почти не тронули, LMS и рейтинг ушли на этап 2 — через процедуру изменений, а не «минус 30% везде».

2

Автоматизация заменяет людей

147 автотестов и 92 проверки в браузере вместо тестировщика; браузер нашёл ошибку, которую тесты на подменённых данных пропустили.

3

Без заказчика задачи не стоят

Заместитель, журнал решений и умолчания. А экономия рождает риски: база стиралась — теперь постоянный диск.

Спасибо, готовы к вопросам

Приложение: майнд-карта

