
1 База по PMBOK

20 мин

Цель одним предложением

За 6 месяцев выпустить Pople v1.0 — единый кабинет студента AlmaU: расписание, оценки, задания, чат. 5 млн ₸, 8 человек.

Нарисуй WBS: проект → 5 пакетов работ → задачи

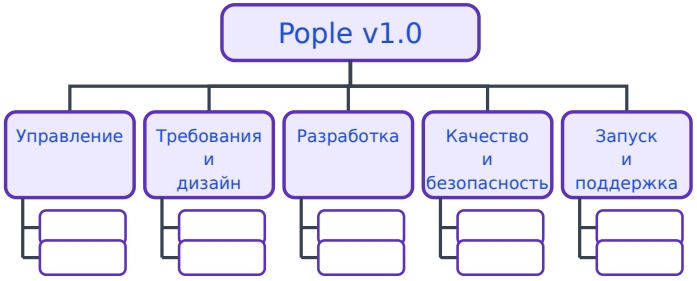

3 главных риска → ответ

R1 потеря данных при обновлении → постоянный диск
R6 заказчик недоступен → заместитель, журнал решений
R7 удалёнка → доска Kanban, письменный стендап

Коммуникации: кому → как часто

Заказчик → заместитель + журнал решений, отчёт раз в месяц
Команда → письменный стендап, доска Kanban
Студенты → форма отзыва на сайте

Бюджет: было 5 млн ₸ → стало 3,5 млн ₸



2 Изменения и стандарты

10 + 10 мин · таблица

	Что изменилось	Какие стандарты (PMBOK, Agile, Kanban, IPMA…)	Что изменится в плане
Волна 1 карточка № 3	Бюджет −30% (5 → 3,5 млн ₸), часть команды удалённо	Kanban (лимит задач) + MoSCoW · IPMA «Люди» · PMBOK: контроль изменений	Новый базовый план 3,5 млн · LMS и рейтинг → этап 2 · письменный стендап · автотесты вместо тестировщика
Волна 2 карточка № 5	Ключевой заказчик в отпуске, нет обратной связи	Agile: заместитель заказчика · PMBOK: заинтересованные стороны · IPMA «Лидерство»	Заместитель с правом решения · журнал решений · разумные умолчания и эскалация · недельное демо


3 Мини-схема гибридного подхода — нарисуй

3 слоя + стрелка обратной связи



4 Лента времени

как менялся подход



5 Чему научились

- Бюджет −30% — это приоритеты, а не «минус 30% везде».
- Удалёнка и нехватка денег: автотесты заменяют тестировщика.
- Без заказчика задачи не стоят: заместитель + журнал решений.

6 Защита 3–4 мин

отметь ☐

☐ 0:00 проект и база
☐ 0:35 карточка 3: бюджет −30%
☐ 1:35 карточка 5: заказчик
☐ 2:30 схема гибрида
☐ 3:00 выводы


1 База по PMBOK

20 мин

Цель одним предложением

напиши: что, для кого, срок, деньги, команда

Нарисуй WBS: проект → 5 пакетов работ → задачи

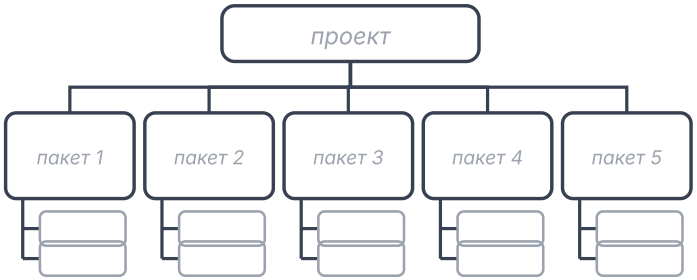

3 главных риска → ответ

R1 … → …
R2 … → …
R3 … → …

Коммуникации: кому → как часто

кто · что получает · как часто

Бюджет: было 5 млн ₸ → стало 3,5 млн ₸

дели на 5–6 частей: управление · дизайн · разработка · качество · запуск · резерв

2 Изменения и стандарты

10 + 10 мин · таблица

	Что изменилось	Какие стандарты (PMBOK, Agile, Kanban, IPMA…)	Что изменится в плане
Волна 1 карточка № 3	*что изменилось (своими словами)*	*какие стандарты и какие элементы берём*	*что меняем в плане: сроки, бюджет, роли, связь*
Волна 2 карточка № 5	*что изменилось (своими словами)*	*какие стандарты и какие элементы берём*	*что меняем в плане: сроки, бюджет, роли, связь*

3 Мини-схема гибридного подхода — нарисуй

3 слоя + стрелка обратной связи

слой 1: рамка — какие стандарты?

слой 2: двигатель — как делаем?

слой 3: руль — как проверяем?

обратная связь

4 Лента времени

как менялся подход

точкой отметь, когда пришло изменение (№…) и что добавили: Agile? ISO? Kanban?

старт · мес. 1 · мес. 2 · мес. 3 · мес. 4 · мес. 5 · мес. 6

волну 1 закрась одним цветом, волну 2 — другим

5 Чему научились

3 вывода: 1) про план · 2) про риски · 3) про стандарты

6 Защита 3–4 мин

отметь ☐

- ☐ 0:00 проект и база
- ☐ 0:35 карточка 3: бюджет −30%
- ☐ 1:35 карточка 5: заказчик
- ☐ 2:30 схема гибрида
- ☐ 3:00 выводы
